

～ 水道のある暮らしを守りたい ～



卸新町水道工事だより



「夜間工事のお知らせ」

2018年 8月発行 Vol.3



株式会社 原組

【地震に強い水道管を入れる工事】

工事名 : 管老幹29第6号 配水幹線布設工事
 工事場所 : 新潟市 東区紫竹卸新町他 地内
 工事期間 : 平成30年3月8日 ~ 平成30年12月14日



【工事の問合せ先】

*** 発注者 *** 新潟市水道局
 技術部管路課 幹線整備係
 担当職員 小林 雄一
 ☎ 025-266-9311

*** 工事施工業者 *** 新潟市江南区割野603-1
 株式会社 原組
 現場代理人 泉 正憲
 ☎ 025-280-2116
 ☎ 090-6622-0939




** 地域の皆様へ **

日頃、皆様方には水道事業に対しご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 8月に入り立秋も過ぎましたが、残暑厳しい日はまだまだ続くようです。当工事でも立坑箇所の埋設管の切廻しが完了し、これより推進工事を行う為の立坑築造工事に入っていきます。
 皆様方には長期にわたり色々ご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。
 ◇ 工事中は通常の交通形態がとれませんので、案内板と誘導員の指示に従い走行願います ◇

◆今後の日程◆

- A 発進立坑工【夜間】 ⌚ 時間 : 21:00~6:00 【日程】 : 8月23日(木)~施工開始
- B 到達立坑工【夜間】 ⌚ 時間 : 21:00~6:00 【日程】 : 9月25日(火)~開始予定

施工位置図

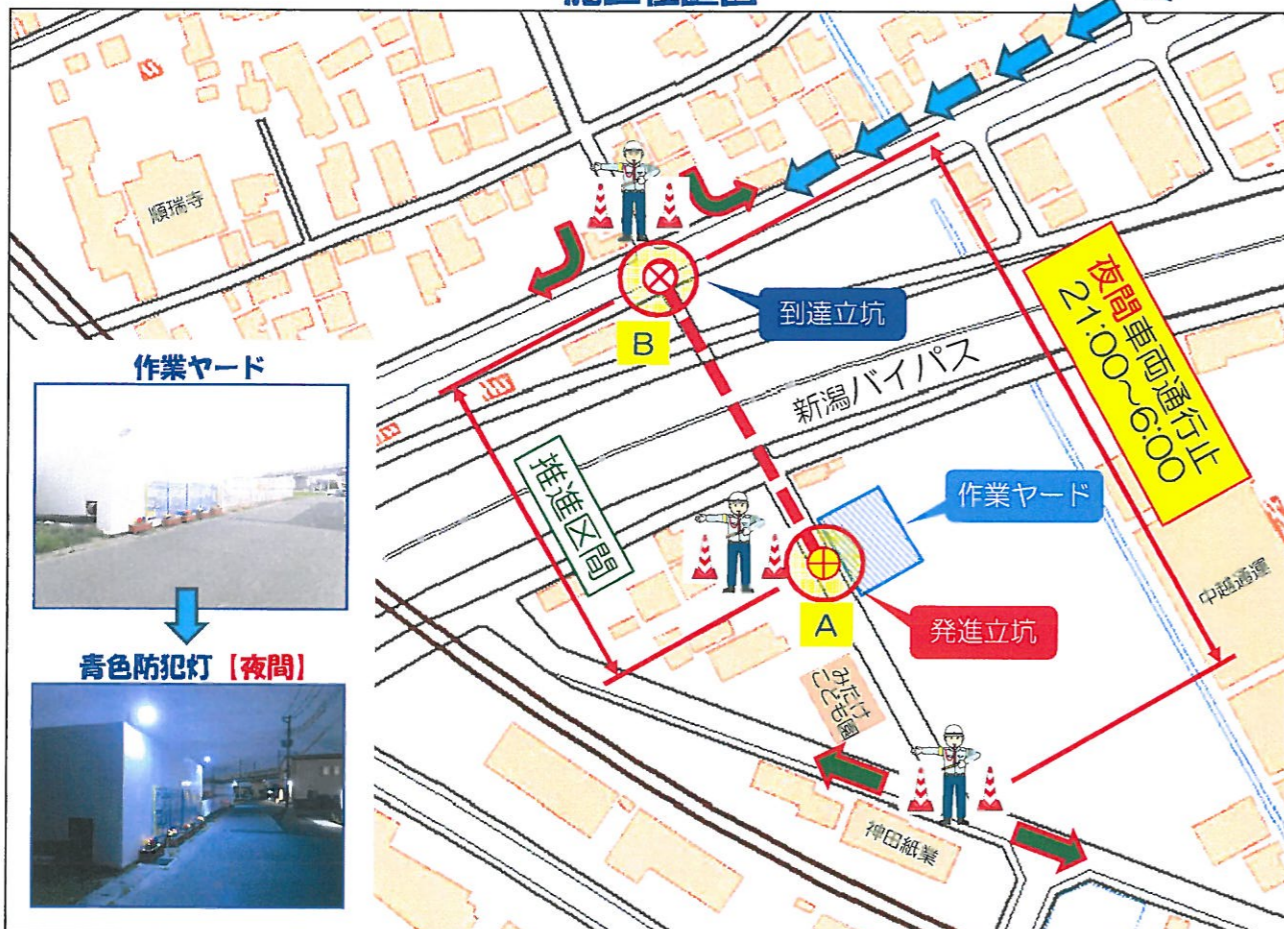

◆ 到達立坑部 構造物撤去状況 ◆

【杭抜機削孔状況】

【杭引抜状況】

【撤去完了】

【立坑築造イメージ】

到達立坑、到達立坑を鋼矢板・ケーシング式土留工法にて掘削します。

【推進工事の流れ】

元押ジャッキ
 推進管
 さや管(推進管)
 水道管

発進立坑から推進機を使ってさや管を推進し地下にトンネルを構築します。
 さや管(推進管)に水道管を通します。

◆今後の流れ◆
 [8/16~9/15]

A 発進立坑部

B 到達立坑部

8月 20 25 31 5 9月 10 15

お盆休暇 8/11~19

立坑築造工 [8/23~9/20予定]

立坑築造工 [9/25~予定]

今後の流れとなりますので宜しくお願いします!
